Hanover St Garage Restoration

Fri 10/20/23
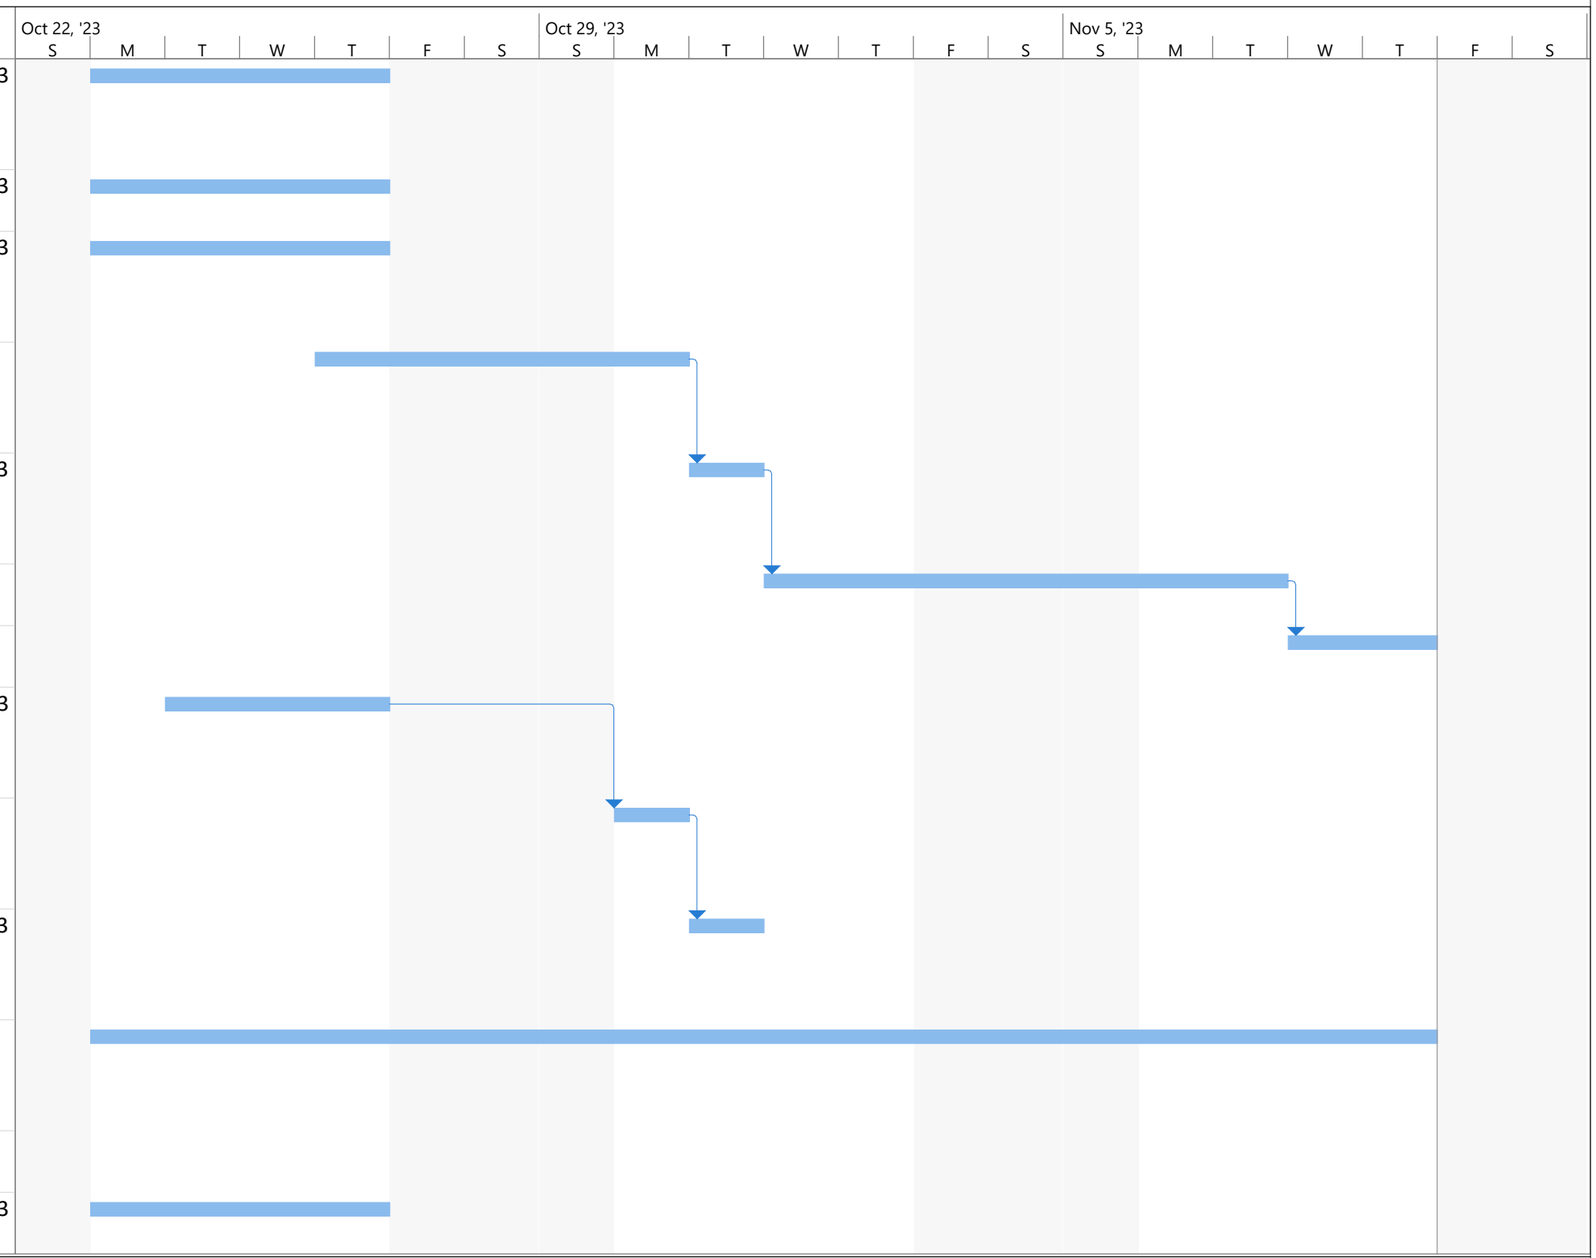
ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	Caulking/Sealant Work - Level 3 (W.I. 11.1, 11.2, 11.4)	4 days	Mon 10/23/23	Thu 10/26/23
2	Remove Shoring/Partitions -Level 3	4 days	Mon 10/23/23	Thu 10/26/23
3	Concrete Repairs - Level 2 - Demo (W.I. 3.1, 3.3, 3.6)	4 days	Mon 10/23/23	Thu 10/26/23
4	Concrete Repairs - Level 2 - Rebar (W.I. 3.1, 3.3, 3.6)	2 days	Thu 10/26/23	Mon 10/30/23
5	Concrete Repairs - Level 2 - Pour (W.I. 3.1, 3.3, 3.6)	1 day	Tue 10/31/23	Tue 10/31/23
6	Concrete Curing Period - Level 2 Repairs	4 days	Wed 11/1/23	Tue 11/7/23
7	Remove Shoring/Partitions - Level 2	2 days	Wed 11/8/23	Thu 11/9/23
8	Underside Repairs - Level 2 - Demo (W.I. 4.1, 4.2)	3 days	Tue 10/24/23	Thu 10/26/23
9	Underside Repairs - Level 2 - Rebar (W.I. 4.1, 4.2)	1 day	Mon 10/30/23	Mon 10/30/23
10	Underside Repairs - Level 2 - Pour (W.I. 4.1, 4.2)	1 day	Tue 10/31/23	Tue 10/31/23
11	Sealant Work - Levels 4 & 5 (W.I. 11.1, 11.2, 11.4, 11.5, 11.7)	12 days	Mon 10/23/23	Thu 11/9/23
12				
13	Plumbing Work	4 days	Mon 10/23/23	Thu 10/26/23
